

新北市大炭國民小學-「112 學年度增班教室整修計畫」

壹、依據：

本校校務發展計畫及教育局 112 學年度公立國民小學預估普通班班級數暨教師員額數辦理。

貳、現況：

為配合 112 學年度國小班級數增班，本校預估新增班級為 3 個班，目前正進行普通班級教室及科任教室調整，以因應新增班級教室需求，惟五樓教室之櫃子及牆面因年久失修，故需進行整修工程，以利於開學後符合教學場域需求，故辦理本計畫。

參、施作說明：


一、新增班級之閱讀角地板、後門、櫃子需進行更新與修繕。

二、教室之牆面需增設矽酸鈣板補土及 3 間教室粉刷工程。

三、新增佈告欄、教師用桌（椅）子、三層櫃等物品。

肆、預計效益：新增之班級教室修繕後，恢復與其它班級一般性之功能使用。

伍、施作平面圖：(計 3 間)

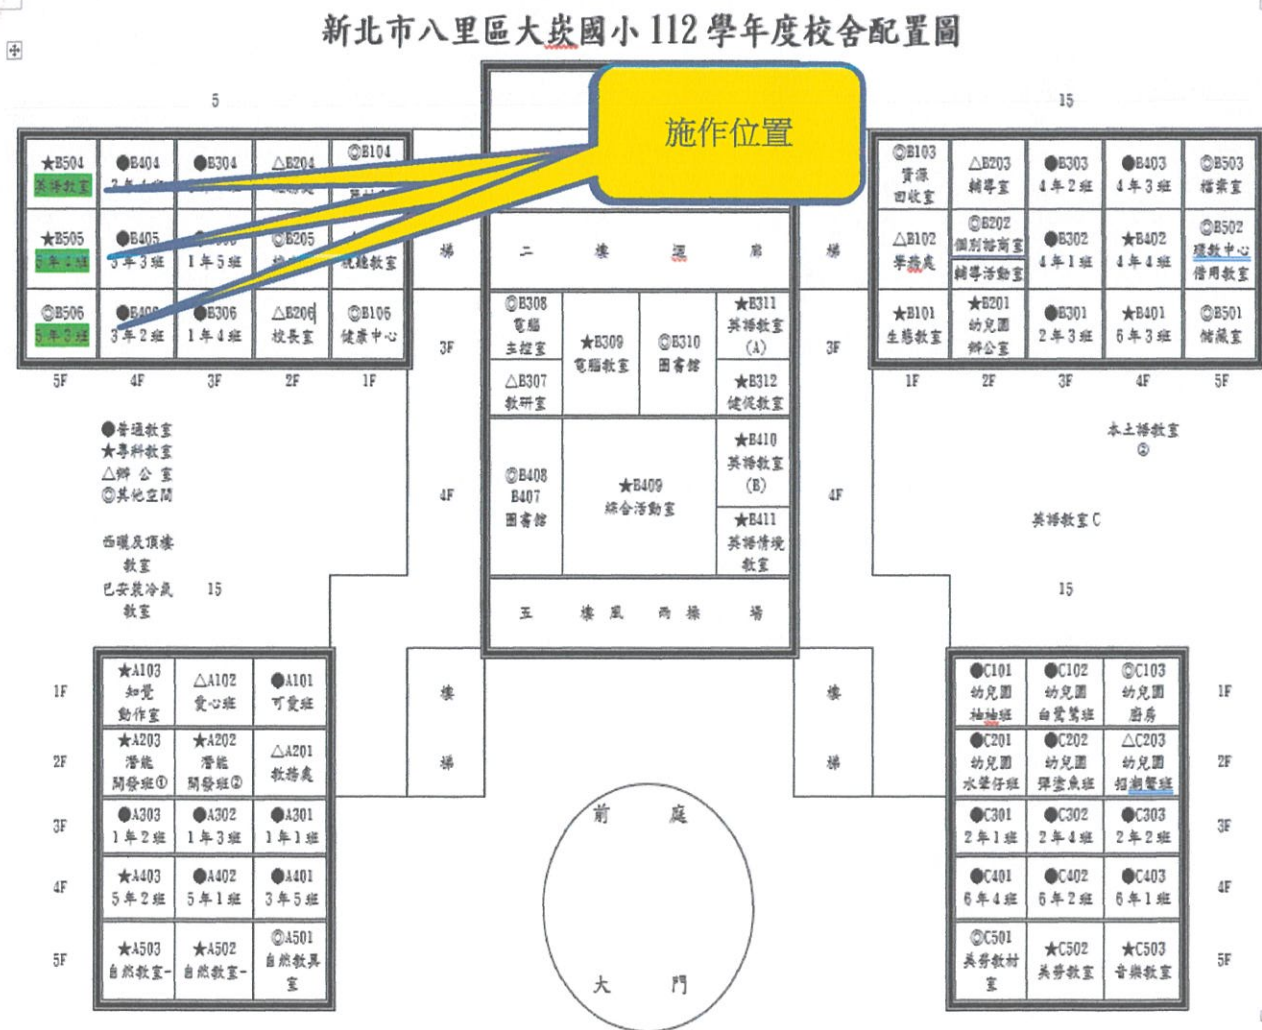

陸、修繕照片：(新增教室為 B504、B505、B506)

	
<p>木作地板，學生閱讀角用</p>	<p>門片及壁扇更新</p>
	
<p>增封矽酸鈣板及補土水泥粉刷（覆蓋）後，增設佈告欄</p>	<p>門片增設及層板安裝</p>
	
<p>增設腳踏板及固定位置</p>	<p>牆面粉刷計 3 間</p>

柒、經費概算：新台幣 14.9 萬，已登錄於校務行政系統/概算管理。

捌、經費來源：新北市教育局補助。

承辦人：

單位主管：

機關首長：

教師兼
總務主任 呂立琪

教師兼
總務主任 呂立琪

校長謝正平

新北市大嵙國小「112 學年度增班教室整修工程」完工成果照片

<p>施工前</p>	<p>施工後</p>
	
<p>木作地板，學生閱讀角用</p>	<p>新製木作地板</p>
	
<p>門片已壞</p>	<p>門片更新</p>
	
<p>壁扇損壞</p>	<p>壁扇更新</p>
	
<p>增封矽酸鈣板及補土水泥粉刷（覆蓋）後，增設佈告欄</p>	

新北市大嵙國小「112 學年度增班教室整修工程」完工成果照片

施工前	施工後
	
門片增設及層板安裝	增設增板安裝計 10 片
	
腳踏板填讓並需要固定位置	增設腳踏板及固定位置
	
牆面粉刷計 3 間	牆面粉刷計 3 間完成
	新購置教師用電腦桌、辦公桌及三層櫃子（506 教室）
